

				
<b>CÓDIGO: PAN-008-M</b> (BID Préstamo: - y BID Donación: GRT/WS-13329-PN)		<b>PANAMÁ</b>		
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDÍGENA EN PANAMÁ</b>				

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del programa es incrementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas ubicadas en la región de Panamá Este, la provincia de Darién y en la Comarca Guna Yala.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar y/o construir nuevos sistemas de agua, y soluciones de saneamiento.
- Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) y las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento (CCAS).
- Contribuir al fortalecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) en el nivel central y en las regionales de salud ubicadas en el área de intervención del programa en su rol de inversor y asesor técnico y social de las JAAR en materia de agua potable y saneamiento rural.

### 1.3. PLAZOS

<b>Fecha de aprobación del Directorio:</b>	11 de julio de 2012
<b>Fecha de firma del Convenio:</b>	25 de marzo de 2013
<b>Fecha de inicio de ejecución:</b>	1 de octubre de 2013
<b>Plazo actual estimado de ejecución:</b>	71,8 meses
<b>Fecha estimada de fin de ejecución:</b>	15 de septiembre de 2020

### 1.4. SOCIOS LOCALES

<b>Entidades ejecutoras:</b>	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) Ministerio de Salud (MINSA)
------------------------------	--

### 1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA


Fuente de financiación	Importe (USD)	Porcentaje (%)
<b>Aportación FCAS</b>	7.500.000	50%
<b>Aportación Local</b>	7.500.000	50%
<b>TOTAL</b>	15.000.000	100%

DESEMBOLSOS USD					
31 de Diciembre de 2019			25 de Septiembre de 2020		
Donación	Otros Aportes	Total	Donación	Otros Aportes	Total
6.746.804,89	6.057.240,00	12.804.044,89	7.500.000	7.500.000	15.000.000

COMPROMISOS USD					
31 de Diciembre de 2018			25 de Septiembre de 2020		
Donación	Otros Aportes	Total	Donación	Otros Aportes	Total
6.746.804,89	6.057.240,00	12.804.044,89	7.500.000	7.500.000	15.000.000

### 1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

**Zona de actuación:** Provincias de Darien y Guna Yala

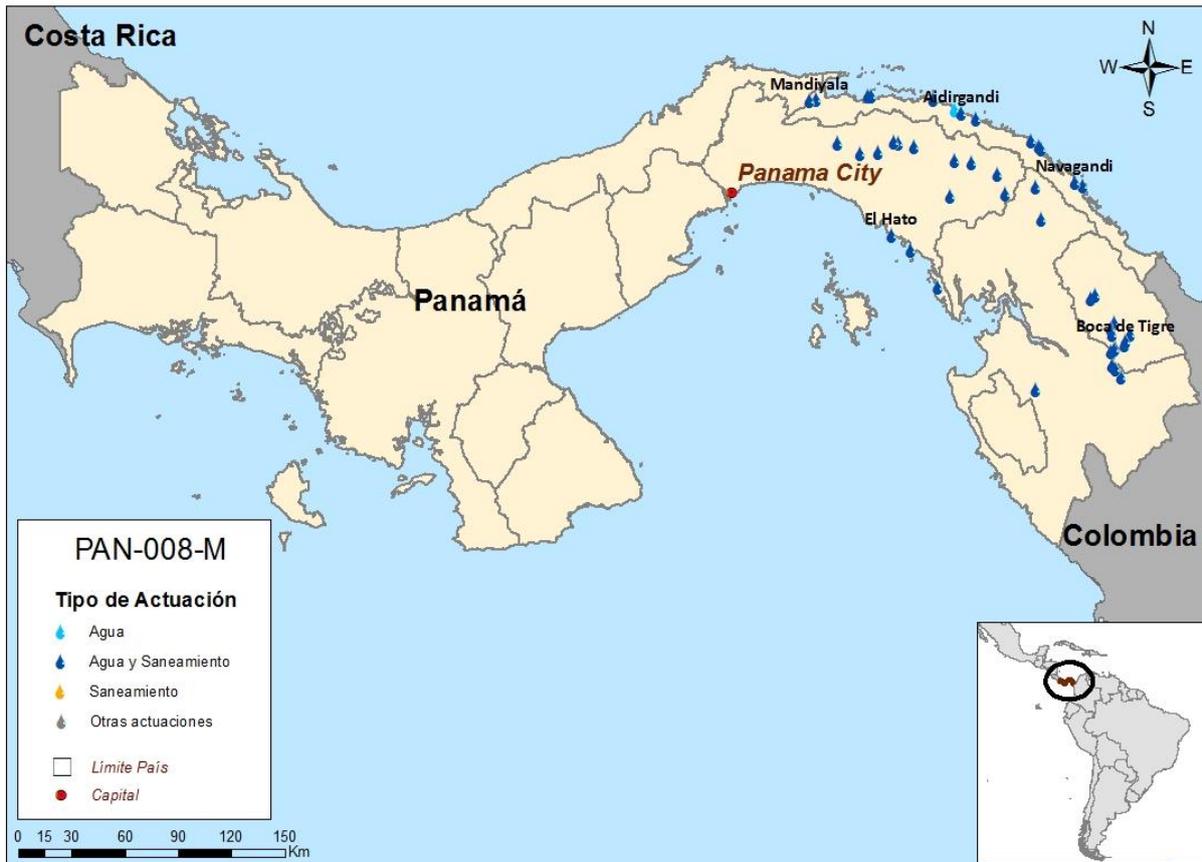

**Tipo de intervención:** Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.  
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario.

**Zona de ejecución:** Rural, en Comunidades indígenas.

**No. Beneficiarios:** 3.015 hogares indígenas y 518 hogares no indígenas.

## 2. LÍNEAS DE TRABAJO

### 2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural. Este componente financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos sistemas de agua potable, así como la ampliación de sistemas existentes, la construcción de soluciones de saneamiento, y la fiscalización y supervisión de las obras. Asimismo, cuando corresponda, se harán intervenciones para la protección de las fuentes de agua.

Componente II: Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de las JAAR. Este componente propone el acompañamiento técnico y social a las JAAR, para fortalecer su estructura organizacional y mejorar sus capacidades de operación, administración y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento rural.

Para ello, además de brindar apoyo a la gestión de las CCAS, se brindará a las JAAR capacitación, con enfoque de interculturalidad y de género, en temas tales como operación y mantenimiento (O&M) de los sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia de la calidad de agua, educación sanitaria y ambiental, protección de las fuentes de agua y manejo de desechos sólidos.

Componente III: Fortalecimiento Institucional del MINSA. Este componente, fortalecerá al MINSA, en su rol de inversor y asesor técnico y social de las JAAR, para garantizar una mejor prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el área rural. Este componente financiaría: el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) a nivel central; la creación y fortalecimiento de los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS) a nivel regional; el diseño e implementación de un plan de difusión y comunicación; y el desarrollo de un sistema único de información georreferenciado de las JAAR.

### 2.2. AVANCES EN HITOS

En 2019 se ha concedido una prórroga para el último desembolso del programa hasta el 25 de septiembre de 2020.

En septiembre de 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas pidió una prórroga de 12 meses para comprometer y liquidar la totalidad de los recursos del programa, finalizar las obras faltantes y reforzar la parte social y de gestión de los servicios, a fin de poder alcanzar los objetivos definidos en el programa.

Para la concesión de la prórroga se estuvo trabajando con el MINSA-DISAPAS en una planificación que fuese factible de llevar a cabo durante el periodo de extensión.

### 2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

#### **Componente 1 - Obras de infraestructura.**

El 85% de los proyectos financiados con recursos del fondo externo del programa se encuentran muy avanzados, quedando por completar las aceptaciones finales de obra, los pagos de cuentas finales y los cierres administrativos de contrato.

Queda pendiente completar las obras en seis comunidades de las comarcas indígenas de Guna Yala y Darién, así como de su supervisión.

#### **Componente 2 - Fortalecimiento de las JAAR.**

En este componente se ha logrado cumplir con todos los productos contemplados dentro de la Matriz de Resultados.

#### **Componente 3 - Fortalecimiento Institucional del MINSA.**

En este componente se ha logrado cumplir con los productos de la Matriz de Resultados, incluyendo la creación y equipamiento de los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOS-R); y la puesta en operación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR).

Es importante que el MINSA garantice la permanencia de los técnicos de los DAPOS-R cuando finalice el programa. Actualmente el costo de este personal está siendo asumido por el aporte local del Programa, y existe el riesgo que cuando finalice el Programa ya no haya recursos asignados para mantener este personal y se desmantelen los DAPOS-R, dejando a las comunidades desatendidas y sin la asistencia técnica necesaria.

**PRODUCTOS Y RESULTADOS**

<b>Avances de resultados.</b>				
<i>Indicador<sup>1</sup></i>	<i>Previsto a Diciembre 2019</i>	<i>Logrado a Diciembre 2019</i>	<i>Previsto a septiembre de 2020</i>	<i>Previsto al final del proyecto</i>
Número de personas con acceso a agua potable.	12.000	13.956	16.148	34.500
Número de personas con acceso a saneamiento básico.	15.956	3.092	20.924	22.524
Número de personas con aguas residuales tratadas.	15.956	3.092	20.924	22.524
Número de personas capacitadas en las instituciones.	1.100	1.100	1.100	1.100

**2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

FCAS	Comprometido Diciembre 2019 (USD)	Desembolsado Diciembre 2019 (USD)
OBRAS	6.126.870	6.126.870
CONSULTORIA	187.596	187.596
BIENES Y SERVICIOS	432.339	432.339
	6.746.805	6.746.805

**3. ENLACES DE INTERÉS**

- MINSA: <http://www.minsa.gob.pa/>,
- RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS INDÍGENAS: [www.politicasingenas.gob.pa/Ngobe-Bugle.html](http://www.politicasingenas.gob.pa/Ngobe-Bugle.html)

<sup>1</sup> En muchos casos la unidad con la que se mide los resultados son hogares. Cuando este es el caso se aplica un coeficiente medio de 4 personas por hogar para convertir hogares en personas.
